

## DELEGERING AV PLANMYNDIGHET FRA NN KOMMUNE TIL INTERKOMMUNAL STYRINGSGRUPPE (AU)

Saksbehandler: Rune Dahl  
Arkivsaksnr.: 18/695

Arkiv: 143 P11

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
/	Kommunestyret	10.12.2018
77/18	Formannskapet	10.12.2018

### Innstilling:

#### INNSTILLING

Planmyndighet for planprosess, herunder behandling av planprogram og varsel av planoppstart, vedtak av planprogram og behandling av planforslag, delegeres fra Bø kommune til interkommunal styringsgruppe (AU). Bø kommunestyre vedtar endelig plan.

#### LOVGRUNNLAG

Plan- og bygningsloven kapittel 9, § 9-3.

### Saksutredning:

#### KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

I forprosjekt «Interkommunal kystsonesplan for Vesterålen», og ved ansettelse av prosjektleder, er det lagt opp til en tidsramme på to år inntil vedtak av kommunedelplan for kystsonen i Vesterålen skal være fattet i hver av kommunene.

Kommunene som deltar i prosjektet er Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. To år er i utgangspunktet minimalt med tid for gjennomføring av en planprosess som dette, men ved samkjøring av alle kommunale høringer underveis i prosessen vil det kunne være mulig å overholde denne tidsrammen.

#### FAKTA I SAKEN

Erfaringer fra andre interkommunale kystsoneprojekter tilsier at to år er i underkant med tid for utarbeidelse av kommunedelplan med bestemmelser og retningslinjer for sjøarealene. Rapport 15/2017 fra Nofima viser at seks av ni interkommunale samarbeidsprosjekter som inngikk i studiet brukte lengre tid enn to år. Gjennomsnittlig tidsbruk for disse seks prosjektene var fem år.

Prosjektene for Midt- og Sør-Troms, Tromsøregionen og Nord-Troms ble alle gjennomført i løpet av to år.

Studiet viser ingen klar sammenheng mellom antall kommuner som inngår i samarbeidet og tidsbruk i planprosessen. I Midt- og Sør-Troms deltok 13 kommuner, mens fem kommuner deltok i Romsdalsfjord-prosjektet, som pågikk over fem år.

Det pekes i studiet på flere faktorer som vil kunne påvirke tidsbruken. Dersom en plan må ut på ekstra høring, eller dersom prosessen ikke blir gjennomført i inneværende kommunestyreperiode, vil det ofte ta en del ekstra tid.

Studiet peker også på at politisk behandling i hvert enkelt kommunestyre, gjennom hele planprosessen, vil kunne påvirke tidsbruken i negativ retning. Delegering av planmyndighet til en interkommunal styringsgruppe vil gjøre prosessen mer effektiv.

Nordland fylkeskommune har i tilsagn om tilskudd til forprosjekt beskrevet at de anser det som viktig at alle kommunale høringer tilknyttet plansamarbeidet samkjøres.

#### VURDERING

Iht. PBL §9-3 vurderes det som hensiktsmessig å delegere planmyndighet fra kommunestyret til interkommunal styringsgruppe (AU) for behandling av planprogram og varsel av planoppstart, vedtak av planprogram og behandling av planforslag. Dette for å få samordnet prosessen og følgelig ha mulighet til å overholde tidsrammen på to år. En slik samordning vil også være fordelaktig for prosjektledelse og administrative ressurser i deltakerkommunene, mht. planlegging av oppgaver og samarbeid på tvers av kommunene.

Kommunestyret treffer endelig planvedtak, iht. PBL § 9-3.


Det legges opp til stor grad av medvirkning i planprosessen, for å sikre at alle interessenter blir ivaretatt. Informasjon om medvirkning og innspill vil fortløpende bli lagt ut på Vesterålen regionråds hjemmeside. Det samme gjelder kontaktinformasjon, planområde (kart), tidsplan og dokumenter til høring. Link til hjemmesiden vil også være tilgjengelig fra hver enkelt kommunes hjemmeside.

Innledningsvis i planprosessen vil det bli opprettet ressursgrupper innen fiskeri, havbruk og reiseliv. Næringsaktører, interesseorganisasjoner og relevante myndigheter vil bli invitert til å delta i disse ressursgruppene. Ressursgruppene vil ha en sentral rolle gjennom hele planprosessen. I forbindelse med høring av planforslag vil det i tillegg bli avholdt folkemøter i hver av kommunene.

Ved delegering av planmyndighet til interkommunal styringsgruppe (AU), vil kommunestyret bli løpende orientert underveis i planprosessen av ordfører og/eller prosjektleder.

Kommunestyret oppfordres til å komme med samlet innspill både i forbindelse med høring av planprogram (mars/april 2019) og i forbindelse med høring av planforslag (februar/mars 2020).

Figuren under viser tidspunkter for de viktigste milepæler og aktiviteter i planprosessen. Milepælene er plassert over tidslinja, mens medvirkningsaktivitetene er plassert under linja. Tidspunktene kan bli justert underveis.

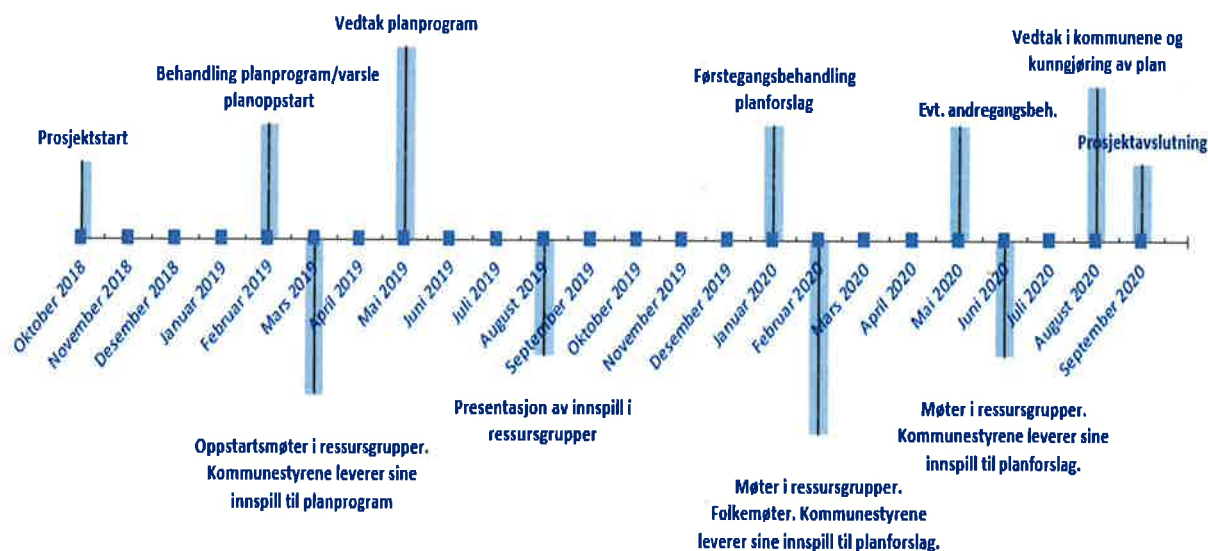

## KONKLUSJON

Planmyndighet for planprosess, herunder behandling av planprogram og varsel av planoppstart, vedtak av planprogram og behandling av planforslag, delegeres fra Bø kommune til interkommunal styringsgruppe (AU). Bø kommunestyre vedtar endelig plan.

Straume 04.12.2018

Gundar Jakobsen  
Rådmann

Rune Dahl  
Teknisk sjef

## Vedlegg:

Tilsagn fra Nordland Fylkeskommune  
Rapport Nofima
